Alcance del Proyecto y Análisis del Mercado de Soluciones – Fan de Pan

ALCANCE DEL PROYECTO

1. Introducción

Fan de Pan pasó de un local en 2017 a más de 45 franquicias. Lo hizo con una casa matriz de 12 personas y sin equipo de sistemas. La expansión comercial fue exitosa, pero la gestión financiera de la red no la acompañó. Cada franquiciado arma su cashflow a mano y con criterios propios, y la casa matriz recién tiene un resultado aproximado de cada local 10 días hábiles después del cierre. En el modelo CMM, esa gestión está en Nivel 1 (T-01 §8). El CEO estima que un local bien gestionado podría ganar hasta un 30% más con la misma facturación. Con el consumo estancado, esa mejora no puede venir de vender más: tiene que venir de controlar costos, márgenes y desvíos.

El proyecto sale de ese diagnóstico. Comparamos la arquitectura actual (T-02) con la de destino (T-03), y la matriz de brechas (T-04) agrupó las brechas de Negocio y de Datos en un solo proyecto. Ese proyecto busca estandarizar la carga financiera de los locales y centralizar la visibilidad de la casa matriz. La vía es contratar una solución de mercado en la nube e implementarla de forma modular (Escenario 4). La iniciativa acompaña la visión de la marca de seguir expandiéndose. Una franquicia con números reales y comparables es más atractiva para nuevos inversores. Además, el "producto franquicia" cambia: pasa a incluir soporte e información financiera para el franquiciado.

> **Objetivo general:** recomendar a la casa matriz de Fan de Pan la solución de mercado que mejor resuelva la estandarización y la centralización de la gestión financiera de su red de franquicias. La recomendación se apoya en una evaluación comparativa de proveedores y se acompaña de una hoja de ruta de implementación por etapas, para que la organización la ejecute con el proveedor que elija. La decisión de contratar y la implementación quedan a cargo de Fan de Pan (EX4).

2. Alcance

Objetivos específicos

ID	Objetivo específico
OE1	Acordar con el sponsor el alcance de la consultoría y los criterios para evaluar el mercado: prefiltros excluyentes y ponderación de las cuatro dimensiones
OE2	Relevar el mercado de soluciones de gestión para cadenas y franquicias gastronómicas y preseleccionar las que cumplan los prefiltros.
OE3	Evaluar a los preseleccionados con la matriz ponderada: cumplimiento por dimensión y costo total de propiedad para unos 45 locales
OE4	Recomendar una solución, o fundamentar por qué ninguna conviene. La recomendación incluye la brecha que la solución no cubre, la hoja de ruta de implementación (piloto de 5 locales y oleadas) y los KPIs para medir el éxito
OE5	Identificar una oportunidad de IA generativa vinculada al proyecto y validar un prototipo con el sponsor
OE6	Cerrar la consultoría con la carpeta final y la presentación ante el sponsor

Exclusiones

- **EX1:** AyresPOS es el único POS de la red (T-03). El sponsor acepta reemplazarlo si la migración es ordenada y paulatina (validación del 19/10). Si un candidato lo reemplaza, su evaluación suma el costo de migrar el sistema de cobro en unos 45 locales (Económico) y cómo se hace esa migración (Técnico).
- **EX2:** Quedan fuera la liquidación de sueldos, la contabilidad e impuestos formales (módulo contable de un ERP) y la facturación electrónica de cada local.

- **EX3:** No se incluye la provisión de hardware ni la conectividad a internet de las sucursales.
- **EX4:** El proyecto no incluye la implementación del producto recomendado. Tampoco incluye la adquisición o contratación, la configuración, el tuning, la personalización, la migración de datos, la capacitación ni el soporte posterior, salvo acuerdo y cotización aparte. Los paquetes 4 a 6 de la EDT se entregan como hoja de ruta para que Fan de Pan los ejecute con el proveedor.
- **EX5:** No se evalúan ni se cotizan desarrollos a medida. Solo se comparan productos existentes en el mercado (prefiltro 2).
- **EX6:** La reingeniería de procesos que pide el software queda dentro de la implementación (paquetes 4.2 y 4.4), no de la consultoría. Esto incluye la estructura estándar de costos y cashflow (PROC-14 y PROC-16) y el valor final de los umbrales. La consultoría deja los lineamientos, y el T-08 aclara quién la hace (proveedor, Matriz o un tercero) y cuánto cuesta.
- **EX7:** Las oportunidades complementarias de T-01 (stock en vivo, rentabilidad por producto, satisfacción del cliente y onboarding digital APP-06) quedan para etapas posteriores. La única excepción es la oportunidad de IA de OE5, que se trabaja solo como prototipo y no se pone en producción.

Esquema de descomposición del trabajo (EDT / WBS)

A. Consultoría (dentro del alcance). La numeración es la misma que usa el Gantt de la sección 4.1. Los números 4 a 6 quedan reservados para la implementación propuesta.

ID	Paquete de trabajo / actividad	Entregable	Hito
0	**Diagnóstico (Épicas 1 y 2, completado)**		
0.1	Caso de negocio y relevamiento (trabajo de campo)	T-01 Caso de negocio	21/08
0.2	AE actual (TOGAF)	T-02 AE actual	04/09 (con presentación de avance)
0.3	Visión de AE destino	T-03 AE destino	11/09
0.4	Brechas y escenarios (Escenario 4)	T-04 Matriz de brechas y escenarios	18/09 (avance 22/09)
1	**Gestión del proyecto**		
1.1	Kick-off con el sponsor y selección del caso	Caso validado por el sponsor	21/08
1.2	Planificación y cronograma	EDT y Gantt (T-05)	25/09
1.3	Seguimiento y validación con el sponsor	Minutas de validación de cada entregable	Continuo
1.4	Carpeta de cierre de la consultoría	T-11 Carpeta de cierre y presentación final	13/11 y 24/11
2	**Definición de alcance y criterios**		
2.1	Objetivos específicos y exclusiones	Documento de alcance (T-05)	25/09
2.2	Ponderación de criterios y prefiltros	Matriz de criterios ponderados (T-05)	25/09
3	**Análisis de mercado y selección**		
3.1	RFI, fichas y preselección	Fichas (T-05) y T-06 Matriz RFP	02/10
3.2	Evaluación de cumplimiento y económica	T-07 Comparación y evaluación económica	16/10
3.3	Análisis de propuesta comercial y selección	T-08 Recomendación, con la hoja de ruta de los paquetes 4 a 6	23/10
7	**Innovación con IA generativa**		
7.1	Oportunidad de innovación con IA generativa	T-09 Oportunidad IA	30/10
7.2	Diseño y validación del prototipo de IA	T-10 Solución IA validada	06/11

B. Implementación propuesta. Fuera del alcance como ya indicamos en EX4.

Es la Fase B del cronograma (sección 4.2). La ejecuta Fan de Pan con el proveedor adjudicado, y la consultoría solo la recomienda.

ID	Paquete de trabajo / actividad	Hito
4	**Diseño y configuración con el proveedor**	
4.1	Diseño de la integración AyresPOS / PedidosYa	
4.2	Modelo de datos y estructura estándar de costos (cashflow)	
4.3	Portal del franquiciado: co-diseño de formularios con los pilotos	
4.4	KPIs, umbrales iniciales y tableros	H-B1 Diseño validado
5	**Piloto en 5 locales**	
5.1	Configuración, roles RBAC y saldos de apertura saneados	
5.2	Capacitación de franquiciados y encargados piloto	H-B2 Go-live (M3)
5.3	Operación del piloto y reportes mensuales de benchmarking	H-B3 Línea base (M6)
5.4	Evaluación de resultados, ajustes y decisión go/no-go	H-B4 Go/no-go (M7)
6	**Despliegue modular a la red**	
6.1	Oleadas 1, 2 y 3 (unos 13, 13 y 14 locales, más las nuevas aperturas)	
6.2	Gestión del cambio y comunicación a la red	
6.3	Medición de desvíos, informe final y cierre	H-B5 Red completa (M12)

3. Beneficios esperados

La consultoría le da al CEO una decisión de compra fundamentada. Los candidatos se comparan con criterios fijados antes de hablar con los proveedores, y la recomendación muestra el costo total y lo que la solución no cubre. Los beneficios para la organización llegan si Fan de Pan implementa la solución recomendada. Cada uno está atado a un objetivo SMART de T-01 y a un hito de la sección 4.3 en el que se mide.

Beneficio	Indicador y meta (T-01)	Objetivo SMART
Cierre mensual más rápido y con números exactos	Días hábiles entre el cierre del mes y el resultado consolidado: de 10 a 5 o menos	SMART 3
Carga financiera estandarizada en toda la red	Locales sin planilla propia: 100% de los 5 pilotos en 6 meses y unos 45 locales al mes 12	SMART 1
Línea base y umbrales propios de la marca	CMV, costo laboral, costos fijos y utilidad neta con valor base y umbral definidos	SMART 2
Menos desvíos y desperdicio (la merma se mide dentro del CMV)	Desvío promedio de la red frente al umbral: −30% respecto de la línea base	SMART 4
Menos trabajo administrativo para el franquiciado	Horas semanales de carga por franquiciado: 3 o menos	SMART 5
Franquicia más atractiva para inversores	Números reales de utilidad por local (US-04) y nuevas aperturas enroladas desde el primer día	US-04

Estos beneficios responden a los dos frentes priorizados en T-01: la gestión financiera descentralizada y heterogénea, y la visibilidad aproximada y manual de la casa matriz. El potencial de hasta un 30% más de utilidad por local que señaló el CEO lo tomamos como el techo de la oportunidad. No lo comprometemos como meta, porque depende de la línea base que todavía no está medida.

4. Cronograma

El cronograma se divide en dos fases. La Fase A es la consultoría: va de agosto a noviembre de 2026 y sigue los hitos de la materia, de modo que cada entregable (T-01 a T-11) es un hito validado con el sponsor. La Fase B es la implementación que proponemos para el Escenario 4 de T-04 (SaaS y piloto modular). Está fuera del alcance (EX4): la ejecuta Fan de Pan con el proveedor adjudicado, arranca con la firma del contrato y dura 12 meses. Sus hitos toman los plazos de los objetivos SMART de T-01. La numeración de las actividades es la de la EDT de la sección 2.

4.1 Fase A — Consultoría (agosto a noviembre de 2026)

Actividad (ID EDT)	S1 10/08	S2 17/08	S3 24/08	S4 31/08	S5 07/09	S6 14/09	S7 21/09	S8 28/09	S9 05/10	S10 12/10	S11 19/10	S12 26/10	S13 02/11	S14 09/11	S15 16/11	S16 23/11
Épicas 1 y 2 — Diagnóstico (completado)																
0.1 Caso de negocio y relevamiento · T-01 (21/08)		◆														
0.2 AE actual (TOGAF) · T-02 (04/09, con presentación de avance)				◆												
0.3 Visión de AE destino · T-03 (11/09)					◆											
0.4 Brechas y escenarios · T-04 (18/09; avance 22/09)						◆	◆									
Gestión del proyecto																
1.1 Kick-off con el sponsor y selección del caso (21/08)		◆														
1.2 Planificación y cronograma · EDT y Gantt (25/09)							◆									
1.3 Seguimiento y validación con el sponsor																
1.4 Carpeta de cierre · T-11 (13/11) y presentación final (24/11)														◆		◆
Épica 3 — Seleccionar una solución (en curso)																
2.1 Objetivos específicos y exclusiones · T-05 (25/09)							◆									
2.2 Ponderación de criterios y prefiltros · T-05 (25/09)							◆									
3.1 RFI, fichas y preselección · T-06 (02/10)								◆								
3.2 Evaluación de cumplimiento y económica · T-07 (16/10)										◆						
3.3 Análisis de propuesta comercial y selección · T-08 (23/10)											◆					
Revisión docente de la RFP y reunión con al menos un proveedor (sin fecha fija)																
Clase con Analía · RFP casi completo (20/10)											◆					
Épicas 4 y 5 — IA generativa y cierre																
7.1 Oportunidad de innovación con IA generativa · T-09 (30/10)												◆				
7.2 Diseño y validación del prototipo de IA · T-10 (06/11)													◆			

Referencias: barra azul = duración de la actividad (desde el hito anterior hasta el propio); barra celeste = actividad continua; ◆ = hito o entregable. T-02 se entrega en la presentación de avance del 04/09; T-04 y T-10 tienen además su presentación de avance (22/09 y 06/11). Las filas sin ID de la EDT son hitos de la cátedra: la clase del 20/10 (RFP casi completo) y la revisión docente de la RFP junto con la reunión con al menos un proveedor. El 06/11 es la presentación de avance, junto con la entrega de T-10. Los paquetes 0 (diagnóstico) y 7 (IA generativa) completan la EDT con el trabajo de las Épicas 1, 2 y 4.

4.2 Fase B — Implementación propuesta (meses desde la adjudicación)

Fuera del alcance (EX4). El piloto sigue la meta SMART de T-01: 5 franquicias en 6 meses. Hay 3 meses de diseño y configuración y 3 meses de operación, y con eso se mide la línea base a los “3 meses de uso”. Las oleadas recién arrancan después de la decisión go/no-go del mes 7.

Actividad (ID EDT)	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12
Fase B1 — Diseño y configuración con el proveedor												
4.1 Diseño de la integración AyresPOS / PedidosYa												
4.2 Modelo de datos y estructura estándar de costos (cashflow)												
4.3 Portal del franquiciado: co-diseño de formularios con los pilotos												
4.4 KPIs, umbrales iniciales y tableros · H-B1 Diseño validado		◆										
5.1 Configuración, roles RBAC y saldos de apertura saneados												
5.2 Capacitación de franquiciados y encargados piloto · H-B2 Go-live			◆									
Fase B2 — Operación del piloto (Transición 1)												
5.3 Operación del piloto y reportes mensuales de benchmarking · H-B3 Línea base						◆						
5.4 Evaluación de resultados, ajustes y decisión go/no-go · H-B4							◆					
Fase B3 — Despliegue modular a la red (Transición 2)												
6.1 Oleadas 1, 2 y 3 (unos 13, 13 y 14 locales, más las nuevas aperturas)												
6.2 Gestión del cambio y comunicación a la red												
6.3 Medición de desvíos, informe final y cierre · H-B5 Red completa												◆
1.3 Comité mensual de seguimiento con el sponsor												

Referencias: las mismas que en 4.1. Los meses cuentan desde la firma del contrato con el proveedor.

4.3 Hitos de la implementación y su vínculo con los objetivos SMART

Hito	Mes	Criterio de aceptación	Objetivo SMART (T-01)
H-B1 Diseño validado	M2	La integración con el POS, la estructura estándar de costos, los formularios y los KPIs están validados por la Matriz y por los 5 pilotos	Prepara SMART 1 y 2
H-B2 Go-live del piloto	M3	Los 5 locales piloto cargan costos en la plataforma y reciben las ventas automáticas del POS	Prepara SMART 1
H-B3 Línea base	M6	100% de los 5 pilotos sin planilla propia; KPIs (CMV, costo laboral, costos fijos y utilidad neta) con línea base y umbral; resultado consolidado en ≤ 5 días hábiles; carga de ≤ 3 h semanales	SMART 1, 2, 3 y 5
H-B4 Go/no-go	M7	Adopción y calidad de datos de los pilotos dentro de lo esperado; formularios ajustados; costo por local acordado	Condición del Escenario 4 (T-04)
H-B5 Red completa	M12	~45 locales en la plataforma; nuevas aperturas enroladas como condición de apertura; reducción del desvío de los pilotos frente a su línea base y primera medición de toda la red	SMART 4 (−30% a 1 año; ver la nota)

Nota sobre H-B5. La línea base se mide en los 5 pilotos en el mes 6, y la red completa recién opera en la plataforma en el mes 12. Por eso el −30% del desvío de toda la red no se puede comprobar en el mes 12: en ese mes se verifica el avance de los pilotos frente a su línea base y se hace la primera medición de toda la red. La meta de −30% para la red se confirma en la medición posterior, con la línea base de la red completa (T-01 ya la marca como preliminar).

5. Stakeholders

Identificamos a las partes interesadas y las ubicamos en un mapa de poder × interés. Cada punto puede representar a un grupo (por ejemplo, el resto de la red) y no solo a una persona. Seguimos los cuatro grupos de la cátedra: Promotores (poder e interés altos), Latentes (poder alto e interés bajo), Defensores (poder bajo e interés alto) y Apáticos (poder e interés bajos). Para cada uno registramos la actitud actual y la buscada, cómo lo afecta el proyecto y la estrategia que proponemos.

El riesgo principal del proyecto es de adopción (T-01, T-03): la red puede leer la visibilidad de sus números como control y no como ayuda. Por eso los franquiciados aparecen separados por grupo y con estrategias propias.

5.1 Mapa de poder × interés

	Interés bajo	Interés alto
Poder alto	**LATENTES** — mantener satisfechos y monitorear 5. Resto de la red (~40 locales) 6. Pan Fresh	**PROMOTORES —** involucrar de cerca 1. CEO (sponsor) 2. Gerente General (Marcos) 3. Ayres IT 4. Franquiciados piloto (5 locales)
Poder bajo	**APÁTICOS —** notificar y monitorear 12. PedidosYa 13. TERRAND 14. Contador externo 15. RRHH y Capacitaciones 16. Marketing 17. Proveedor de IT tercerizado	**DEFENSORES —** mantener informados y acompañar 7. Administración y Finanzas (Matriz) 8. Supervisión 9. Encargados y personal de local 10. Nuevos franquiciados e inversores 11. Otros candidatos (Maxirest, Bistrosoft)

Poder e interés valorados por el equipo con la información de T-01 a T-04. Lo que define el grupo es el cuadrante.

5.2 Matriz de stakeholders

Stakeholder	Poder / Interés	Actitud actual → buscada	Cómo lo afecta el proyecto	Estrategia
Promotores — poder alto, interés alto · Involucrar de cerca				
1. CEO – Alexis Horianski (sponsor)	Alto / Alto	Promotor → Promotor	Decide la inversión y concentra las decisiones de TI (no hay área de sistemas).	Involucrar de cerca: validar cada entregable (T-05 a T-08), comité mensual durante la implementación y decisión go/no-go del despliegue.
2. Gerente General (Marcos)	Alto / Alto	A relevar → Promotor	Coordina las áreas que adoptan los nuevos procesos.	Involucrar de cerca: proponerlo como referente funcional interno (mitiga el riesgo “sin equipo de TI”, T-03).
3. Ayres IT (POS actual y candidato preseleccionado)	Alto / Alto	Colaborador (con interés comercial)	Controla los datos de venta y su API; puede ser el adjudicatario.	Involucrar con reglas claras: pedir documentación de API, competir en igualdad con el resto en la RFP y cuidar la dependencia de un solo proveedor.
4. Franquiciados piloto (5 locales)	Alto / Alto	Expectante → Promotor	Cambian su backoffice y exponen sus números a la Matriz; de su adopción depende el riesgo principal del proyecto (T-01, T-03).	Involucrar de cerca: co-diseño de formularios, reglas RBAC explícitas (cada uno ve solo lo suyo), beneficio directo (benchmarking) y costo del piloto asumido por la Matriz.
Latentes — poder alto, interés bajo · Mantener satisfechos y monitorear				
5. Resto de la red (~40 locales)	Alto (colectivo) / Bajo	Reticente → Neutral / Promotor	Se suman por oleadas; temor a un control punitivo.	Mantener satisfechos y monitorear: comunicar los resultados del piloto, el calendario de oleadas y qué datos ve la Matriz y para qué.
6. Pan Fresh (proveedor central, T-03)	Alto / Bajo	Neutral → Colaborador	Fuente del costo de mercadería para el CMV automático: sin sus datos de compras el CMV no se autocompleta.	Mantener satisfecho: acordar formato y frecuencia del envío de datos de compras.
Defensores — poder bajo, interés alto · Mantener informados y acompañar				
7. Administración y Finanzas (Matriz)	Bajo / Alto	Neutral → Promotor	Cambian PROC-14 y PROC-16; cierre consolidado en ≤ 5 días hábiles. No deciden la inversión ni el proveedor, pero son usuarios clave.	Mantener informados y acompañar: co-definir la estructura estándar de costos/cashflow y los KPIs; usuarios clave en las pruebas.
8. Supervisión (auditoría de locales, PROC-11)	Bajo / Alto	Neutral → Promotor	Pasan de la visita mensual a trabajar con alertas y tableros.	Mantener informados y acompañar: definir con ellos los umbrales y el circuito alerta → plan de acción → seguimiento.
9. Encargados y personal de local	Bajo / Alto	Neutral → Neutral	Cargan datos desde el celular (mobile-first).	Mantener informados: capacitación corta, instructivos y un canal de soporte.
10. Nuevos franquiciados e inversores	Bajo / Alto	Promotor → Promotor	Enrolamiento obligatorio al abrir; acceso a números reales (US-04).	Mantener informados: incorporar la plataforma a la propuesta comercial de la franquicia.
11. Otros candidatos (Maxirest, Bistrosoft)	Bajo / Alto	Interesados (comerciales)	Compiten en la RFP.	Mantener informados: mismas reglas, plazos y respuestas para todos los oferentes.
Apáticos — poder bajo, interés bajo · Notificar y monitorear				
12. PedidosYa	Bajo / Bajo	Neutral	Fuente de las ventas de delivery; según su información pública, los tres proveedores preseleccionados lo integran.	Notificar y monitorear: verificar la integración a través del proveedor elegido.

Stakeholder	Poder / Interés	Actitud actual → buscada	Cómo lo afecta el proyecto	Estrategia
13. TERRAND	Bajo / Bajo	Neutral	Fuente de los datos de auditoría (DAT-03 / ENT-Auditoría).	Notificar y monitorear: confirmar con Supervisión el formato de exportación de los reportes de auditoría.
14. Contador externo (PROC-20)	Bajo / Bajo	Neutral → Colaborador	Recibe información estandarizada; la contabilidad formal queda fuera del alcance (EX2).	Notificar: acordar el formato de exportación para el cierre contable. Pasaría a Defensor si se pidiera integración contable.
15. RRHH y Capacitaciones	Bajo / Bajo	A relevar	Afectada por el onboarding digital (APP-06, REQ-NEG-06), que queda para después de la transición.	Notificar y monitorear: pasaría a Defensor al encarar APP-06.
16. Marketing	Bajo / Bajo	A relevar	Sin impacto directo; podría usar los números reales en la propuesta a inversores (US-04).	Notificar institucionalmente.
17. Proveedor de IT tercerizado	Bajo / Bajo	A relevar	Soporta hoy la infraestructura de la Casa Matriz (la organización no tiene área de sistemas, T-03). Con la solución SaaS cambia su carga de trabajo, y la implementación puede requerir soporte con SLA (T-03 §4).	Notificar y monitorear: relevar qué soporte técnico tiene hoy Fan de Pan y acordar con él el acompañamiento de la integración.

Estrategias: Involucrar de cerca (Promotores) · Mantener satisfechos y monitorear (Latentes: pueden bloquear el proyecto aunque hoy les interese poco) · Mantener informados y acompañar su adopción (Defensores) · Notificar y monitorear (Apáticos, que pueden cambiar de cuadrante).

5.3 Plan de comunicación por stakeholder

Los consultores no emiten estas comunicaciones: recomendamos al sponsor qué comunicar a cada grupo, cuándo y por qué canal. Es una propuesta del equipo, a validar con el sponsor.


Stakeholder	Qué se comunica	Cuándo	Canal	Responsable
Promotores — poder alto, interés alto · Involucrar de cerca				
1. CEO	Avance de cada entregable, decisiones que necesitamos de él (proveedor, costo del piloto) y riesgos.	Con cada entregable (T-05 a T-08) y, en la implementación, comité mensual.	Reunión (presencial o Teams) y resumen escrito.	Equipo consultor; luego, la Matriz.
2. Gerente General	Su rol como referente funcional interno y los cambios en las áreas que coordina.	Antes del go-live del piloto y luego mensual.	Reunión y minuta.	Sponsor, con apoyo del equipo.
3. Ayres IT	Requerimientos de integración, reglas de la RFP y pedido de documentación de API.	Durante la RFP (T-06 a T-08), solo con aprobación docente.	Mail y reunión/demo, con las mismas condiciones que el resto.	Equipo consultor.
4. Franquiciados piloto	Beneficio directo, qué datos ve la Matriz y qué ve cada uno, calendario del piloto.	Al inicio del piloto, durante el co-diseño y cada mes con el reporte de benchmarking.	Talleres de co-diseño y canal formal de la plataforma.	Matriz (Administración), con apoyo del equipo.
Latentes — poder alto, interés bajo · Mantener satisfechos y monitorear				
5. Resto de la red	Resultados del piloto, calendario de oleadas y qué datos ve la Matriz y para qué.	Al cerrar el piloto (meses 6 y 7) y antes de cada oleada.	Comunicado de la Matriz y reunión de la red.	Sponsor / Matriz.
6. Pan Fresh	Formato y frecuencia del envío de datos de compras.	Durante el diseño (Fase B1).	Reunión y acuerdo por escrito.	CEO.
Defensores — poder bajo, interés alto · Mantener informados y acompañar				

Stakeholder	Qué se comunica	Cuándo	Canal	Responsable
7. Administración y Finanzas	Estructura estándar de costos, KPIs y objetivo de cierre en ≤ 5 días hábiles.	Durante el diseño (B1) y en las pruebas previas al go-live.	Talleres de trabajo.	Equipo consultor; luego, la Matriz.
8. Supervisión	Umbrales y circuito alerta → plan de acción → seguimiento.	Durante el diseño (B1) y en el piloto.	Talleres de trabajo.	Matriz.
9. Encargados y personal	Instructivo de carga y dónde pedir ayuda.	Antes del go-live del piloto.	Capacitación corta e instructivo.	Matriz, con el proveedor.
10. Nuevos franquiciados e inversores	La plataforma como parte de la propuesta de la franquicia y el acceso a números reales.	Desde que el enrolamiento sea obligatorio (después del go/no-go).	Propuesta comercial.	CEO / Matriz.
11. Otros candidatos	Mismas reglas, plazos y respuestas que Ayres IT.	Durante la RFP.	Mail con el mismo contenido para todos.	Equipo consultor, con aprobación docente.
Apáticos — poder bajo, interés bajo · Notificar y monitorear				
12. PedidosYa	Sin comunicación directa; se verifica la integración.	Durante el diseño (B1).	A través del proveedor adjudicado.	Proveedor adjudicado.
13. TERRAND	Formato de exportación de los reportes de auditoría.	Durante el diseño (B1).	A través de Supervisión.	Matriz.
14. Contador externo	Formato de exportación para el cierre contable.	Antes del primer cierre en la plataforma (mes 6).	Mail y reunión.	Administración.
15. RRHH y Capacitaciones	Estado del proyecto y cuándo se encarará el onboarding digital.	En los hitos H-B3 y H-B4.	Comunicación interna institucional.	Sponsor.
16. Marketing	Estado del proyecto.	En los hitos H-B3 y H-B4.	Comunicación interna institucional.	Sponsor.
17. Proveedor de IT tercerizado	Alcance de la integración y cambios en la infraestructura que le toquen.	Durante el diseño (B1).	Reunión y mail.	Matriz.

6. Impacto en la arquitectura: gráfico resumen y reflexión

Contrastamos tres estados de la arquitectura empresarial de Fan de Pan con la escala de madurez CMM que usamos en T-01 (1 = inicial; 2 = repetible; 3 = definido; 4 = gestionado y medido; 5 = optimizado). Las seis dimensiones agrupan los bloques de construcción de las cuatro capas TOGAF que cruzamos en la matriz de brechas de T-04; la columna Capa TOGAF indica a cuál pertenece cada una.

- **AE Actual (T-02):** lo que relevamos hoy.
- **AE de Transición (proyectada por el equipo):** el estado al cierre del piloto (mes 6 de la Fase B). La plataforma opera en 5 locales y el resto de la red sigue con Excel. Puntuamos la capacidad instalada y descontamos que la adopción todavía es parcial.
- **AE Destino (T-03):** la visión a 2–3 años, con toda la red integrada.

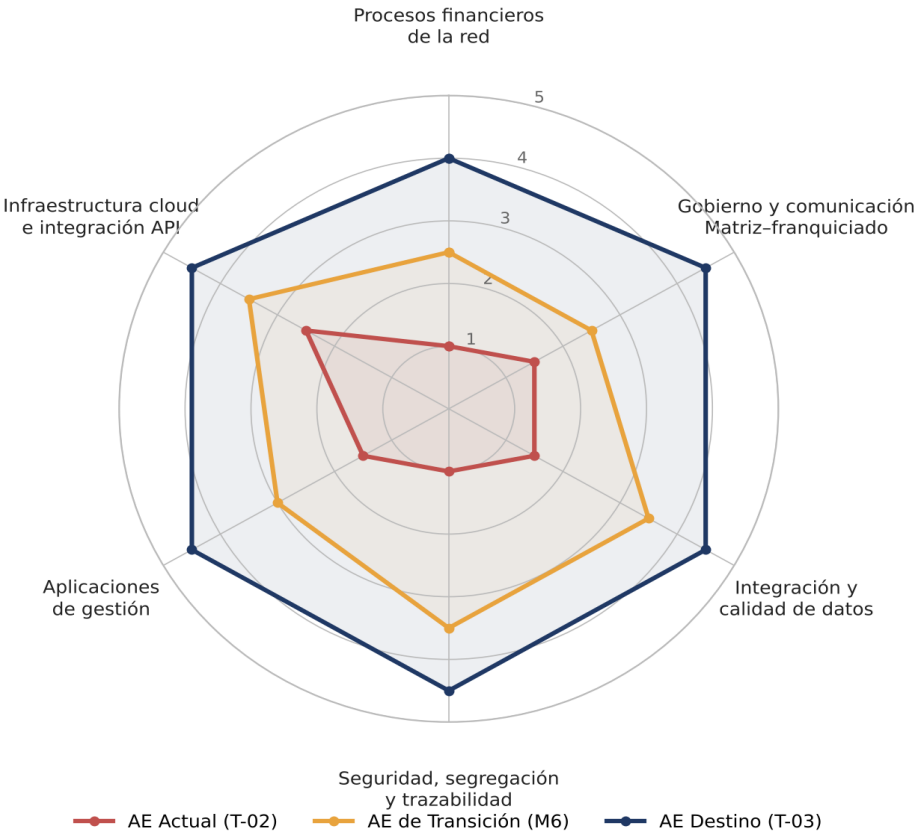

Dimensión (TOGAF)	Capa TOGAF	Actual (T-02)	Transición (M6)	Destino (T-03)	Qué explica la evolución (IDs)
Procesos financieros de la red	Negocio	1	2,5	4	Hoy es Nivel 1 CMM (T-01 §8): cashflows a mano y con criterios propios. En la transición el proceso estándar (REQ-NEG-01/03) opera solo en 5 de ~45 locales; el resto sigue en Excel.
Gobierno y comunicación Matriz–franquiciado	Negocio	1,5	2,5	4,5	Hoy existe visibilidad, pero aproximada y manual, y el canal es WhatsApp. El piloto suma reportes de benchmarking y planes de acción (REQ-NEG-02/05), sin alcance de red todavía.
Integración y calidad de datos	Datos	1,5	3,5	4,5	De silos en CSV/Excel (DAT-01 a DAT-03 y DOC-01) a repositorio central con ingesta automática del POS y cashflow estandarizado (REQ-DAT-01/02/03).
Seguridad, segregación y trazabilidad	Datos	1	3,5	4,5	Hoy sin control de cambios ni permisos. El SaaS trae RBAC y audit trail desde el inicio (REQ-DAT-04/05, habilitado por REQ-TEC-03/05): son condición para que el franquiciado acepte.
Aplicaciones de gestión	Aplicaciones	1,5	3	4,5	De Shadow IT a plataforma + tablero (APP-01/02/03). Alertas y canal formal (APP-04/05) quedan parciales y el onboarding digital (APP-06) es posterior.
Infraestructura cloud e integración API	Tecnología	2,5	3,5	4,5	Ya opera 100% sobre SaaS sin servidores propios, pero sin APIs integradas ni SLA unificado (CLOUD-01). Se suman API REST y mobile-first (REQ-TEC-02/04).

Reflexión sobre el impacto de la consultoría y la transición

El diagnóstico muestra una madurez despareja. La operación comercial, las compras y la infraestructura (100% SaaS, sin servidores propios) están ordenadas, pero la gestión financiera de la red está en Nivel 1:

cada franquiciado arma su cashflow a su manera y la Casa Matriz llega a una utilidad aproximada recién 10 días después del cierre (T-01). El gráfico lo muestra: el polígono actual se achica en los ejes de procesos financieros y de seguridad y trazabilidad (1) y en gobierno, integración de datos y aplicaciones (1,5), mientras que la infraestructura ya está en 2,5.

Impacto en la arquitectura destino. La consultoría no construye todo el destino: recomienda su núcleo, que es la plataforma financiera, la ingesta desde el POS, el tablero y la seguridad por franquiciado (APP-01 a 03, REQ-DAT-01 a 04). Por eso los ejes que más avanzan son los de Datos (integración y calidad, +2; seguridad y trazabilidad, +2,5), y la infraestructura, que ya opera 100% sobre SaaS, es la que menos cambia (+1). Si se confirma la preselección de Ayres IT, el destino pasa a ser una ampliación del ecosistema que la red ya usa: baja el riesgo de integración, pero aumenta la dependencia de un solo proveedor. La RFP (T-06) y la evaluación (T-07) van a decidir si una misma solución cubre las brechas que todavía no están confirmadas.

Cómo proponemos la transición. Siguiendo el ADM de TOGAF, Fan de Pan ejecutaría dos transiciones antes del destino (Fase B, fuera del alcance por EX4): un piloto en 5 locales (M1–M6, con el costo a cargo de la Matriz, confirmado por el sponsor) y el despliegue a la red en tres oleadas (M7–M12), que solo arranca si el piloto aprueba el go/no-go. El destino a 2–3 años suma onboarding digital (APP-06), margen por producto (REQ-DAT-06), OCR de comprobantes y el asistente de IA de la Épica 4. La brecha que queda está sobre todo en Negocio (gobierno y comunicación, 2 puntos): la tecnología se contrata, pero el cambio de hábito de más de 45 locales se logra de a poco. Por eso el éxito se mide por los objetivos SMART: resultado consolidado en ≤ 5 días hábiles y −30% de desvíos frente a los umbrales de la marca.

PRIORIDADES DEL CLIENTE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Para salir al mercado traducimos las necesidades de Fan de Pan en criterios ponderados. Antes de ponderar aplicamos prefiltros excluyentes que no suman puntos, sino que dejan afuera a cualquier solución que no los cumpla.

Prefiltros:

1. Solución en la nube (SaaS), sin servidores propios (REQ-TEC-01; la casa matriz no tiene equipo de IT).
2. Producto existente en el mercado, no un desarrollo a medida (EX5).
3. Costo razonable para una red de más de 45 locales con estructura liviana.
4. Cubrir como mínimo la carga estandarizada por local y la visión consolidada para la casa matriz (US-01 y US-02, Must have).

Fan de Pan no tiene equipo de sistemas: la tecnología está tercerizada y las decisiones recaen en el CEO. Por eso se busca que sea una solución probada en el mercado y con un proveedor que la sostenga. La ponderación la validó el sponsor el 19/10 según su orden de prioridades: implementar con el sistema actual (Técnico), que resuelva la gestión (Funcional), el precio (Económico) y el proveedor.

Aspecto a evaluar	Ponderación	Qué captura	Justificación desde el alcance
Funcional	25%	Carga estandarizada de costos por local con CMV autocompletado; consolidación y tablero para la casa matriz; canal de comunicación y planes de acción; alertas de desvío; facilidad de uso para franquiciados no técnicos	Es el núcleo del problema que priorizó el sponsor (T-01 §7): US-01, US-02 y US-03 son *Must have*, y APP-01, 03, 04 y 05 vienen de T-03. La usabilidad responde al objetivo de carga ≤ 3 h semanales por franquiciado (T-01 §5). Responde a OE2 y OE3. Es la prioridad 2 del sponsor
Técnico	35%	Integración por API con AyresPOS y PedidosYa; aislamiento de datos por franquicia; diseño mobile-first; registro de auditoría; migración desde AyresPOS si el candidato lo reemplaza (EX1)	Sin integración vuelve la carga manual (REQ-NEG-01). El riesgo de integración está en Medio/Alto (T-03 §4). El franquiciado no expone sus números sin aislamiento (T-01 §9). REQ-TEC-02 a 05. Es la prioridad 1 del sponsor: no es fácil migrar; acepta cambiar el POS si la migración es ordenada y paulatina.
Proveedor	15%	Trayectoria, casos de éxito en cadenas y franquicias gastronómicas, presencia y soporte en Argentina, partner implementador, SLA y continuidad	La casa matriz no tiene equipo de sistemas y el CEO concentra las decisiones tecnológicas (T-01 §3 y §9). La "ausencia de equipo propio de IT" es un riesgo Alto/Alto (T-03 §4). Se requiere una solución probada y un proveedor que responda. Además, Fan de Pan implementa con el proveedor que elija (EX4).Es la prioridad 4 del sponsor
Económico	25%	Abono mensual por local, costo de implementación, costo total de propiedad y moneda (pesos o dólares); costo de migrar el sistema de cobro en unos 45 locales si el candidato reemplaza AyresPOS (EX1)	Estructura liviana y consumo estancado (T-01). Riesgos de costo y de "quién paga el sistema" (T-03 §4). Es la prioridad 3 del sponsor. Se compara el costo total para unos 45 locales (OE3).
TOTAL	**100%**		

FICHAS DE PROVEEDORES

Partimos de 8 soluciones y aplicamos los prefiltros:

- **Power BI y Tableau** quedaron afuera: son herramientas de BI genéricas, y la carga de costos y el canal de comunicación habría que construirlos, lo que es un desarrollo a medida (prefiltro 2, EX5).
- **Restaurant365** quedó afuera: cuesta USD 469–689 por local por mes (prefiltro 3) y no tiene presencia verificada en Argentina.
- **Fudo** quedó afuera: está pensado para restaurantes independientes y no encontramos información pública de una línea para cadenas o franquicias con consolidación de varios locales (prefiltro 4, US-02).

Las siguientes 4 cumplen los aspectos más ponderados.

Ayres IT

AyresPOS + AyresBoard + AyresERP

Antecedentes

- **Tipo social:** empresa privada argentina (opera como Ayres IT; razón social no publicada) *[A CONFIRMAR EN RFP]*
- **Sede y filiales:** Buenos Aires, con operación en Latinoamérica y España.
- **Trayectoria:** fundada en 2004. Más de 20 años desarrollando software para cadenas y franquicias gastronómicas, con más de 2.000 sucursales activas y más de 350 marcas, entre ellas Kentucky, Havanna, Café Martínez y The Coffee Store.
- **Recursos y estrategia:** equipo propio, no tercerizado ("el que desarrolla es el que atiende"). Es socio de AAMF y GAF, las asociaciones de franquicias de Argentina. Hoy suma módulos de BI e IA (AyresBoard, AyresIA).

Presentación del producto

- **Producto:** AyresPOS (punto de venta, que Fan de Pan **ya usa**), más AyresBoard (tablero) y AyresERP (gestión central).
- **Funcionalidades clave:**
  - Tablero para varios locales en tiempo real: venta total, ticket promedio, caja y medios de pago, gastos y retiros, con cambio entre sucursales en un toque.
  - ERP con compras, producción, recetas y stock, con pedidos automáticos desde las sucursales.
  - Trazabilidad de los movimientos.
- **Requerimientos técnicos:** acceso web y mobile. El POS funciona sin conexión y sincroniza con la central. Maneja varios CUIT y cumple la normativa fiscal argentina (ARCA). *[A CONFIRMAR EN RFP: si el tablero y el ERP son 100% cloud]*
- **Integración:** más de 24 integraciones nativas (PedidosYa, Rappi, Mercado Pago, entre otras) y conexión con ERPs externos. *[A CONFIRMAR EN RFP: si tiene API abierta y documentada, y si la integración con PedidosYa está activa en la red y consolida esas ventas en AyresBoard]*
- **Licenciamiento:** no publicado. *[A CONFIRMAR EN RFP]*

Alineación con los criterios del cliente

- **Proveedor:** es su punto más fuerte: proveedor local, con trayectoria en franquicias y soporte propio todos los días del año.
- **Técnico:** al ser una **ampliación del producto actual**, la integración con el POS ya existe y no hay migración ni cambio de sistema para los franquiciados.
- **Pendiente:** la web no muestra la carga de costos de estructura por local (alquiler, sueldos, servicios), el cashflow, las alertas por umbral, el canal de comunicación ni los permisos por franquiciado. *[A CONFIRMAR EN RFP]*

Maxirest

SaaS de gestión y BI gastronómico

Antecedentes

- **Tipo social:** empresa privada argentina; el producto lo desarrolla MaxiSistemas. *[A CONFIRMAR EN RFP: razón social]*
- **Sede y filiales:** barrio de Once, CABA, con presencia en Uruguay.
- **Trayectoria:** fundada en 1991 por los hermanos Gastón y Aldo Pecile. Más de 17.500 licencias en el país (dato de 2021) y clientes como Havanna, Bonafide, Kentucky, Don Julio, Antares y Guerrín.
- **Recursos y estrategia:** más de 100 empleados (dato de 2021). Plan de expansión regional y oferta para cadenas y franquicias.

Presentación del producto

- **Producto:** Maxirest, más Maxirest Admin (centralización de sucursales).
- **Funcionalidades clave:**
  - Información de todas las sucursales en un mismo software.
  - Reportes y auditorías por local.
  - Recetas, insumos y listas de precios centralizados.
  - Stock y personal.
  - Analítica de ventas en tiempo real y alertas generadas con IA.
- **Requerimientos técnicos:** SaaS, con funcionamiento sin conexión y sincronización.
- **Integración:** PedidosYa, Rappi, Mercado Pago, Clover y Payway.
- **Licenciamiento:** abono mensual. Precio publicado: ARS 65.000 por mes en promoción (ARS 86.000 regular), más IVA. Soporte por chat y WhatsApp de lunes a sábado de 9 a 24 h; soporte 24/7 con costo adicional. *[A CONFIRMAR EN RFP: si el precio es por local y si hay bonificación por volumen]*

Alineación con los criterios del cliente

- **Proveedor:** es su punto más fuerte: más de 30 años, líder local y con cadenas grandes como clientes.
- **Funcional:** sólido en la centralización de sucursales.
- **Técnico:** es competencia de AyresPOS y no se integra con él, así que implica reemplazarlo. Por EX1, su evaluación suma el costo de migrar el sistema de cobro (Económico) y cómo se hace esa migración (Técnico).

Bistrosoft

Antecedentes

- **Tipo social:** empresa privada argentina. *[COMPLETAR: razón social y año de fundación]*
- **Sede y filiales:** Argentina, con operación en México, España y Uruguay.
- **Trayectoria:** se presenta como la primera solución gastronómica sobre Android en Argentina y tiene una línea específica para cadenas y franquicias. Publica un caso de franquicia con varias sucursales (Monkey Papas, México). *[A CONFIRMAR EN RFP: casos en Argentina]*
- **Recursos y estrategia:** academia online para capacitar al personal y soporte por WhatsApp y email.

Presentación del producto

- **Producto:** Bistrosoft para cadenas y franquicias.
- **Funcionalidades clave:**
  - Tablero centralizado con la información de todas las sucursales.
  - Precios y menú estandarizados, con configuración por local.
  - Recetas, stock y centro de producción.
  - **Niveles de permiso por franquiciado**.
- **Requerimientos técnicos:** 100% cloud, accesible desde cualquier dispositivo con internet.

- **Integración:** Se integra con PedidosYa, Rappi, Mercado Pago y Contabilium. Con AyresPOS no se integra, porque Ayres es su competencia.
- **Licenciamiento:** cotización personalizada. *[A CONFIRMAR EN RFP]*

ALINEACIÓN CON LOS CRITERIOS DEL CLIENTE

- **Funcional y Técnico:** cubre la visión centralizada y el aislamiento por franquiciado (REQ-TEC-03), y es cloud nativo.
- **Proveedor:** es su punto débil, porque hay poca información pública de trayectoria y casos de éxito.
- **Técnico:** igual que Maxirest, es competencia de AyresPOS y no se integra con él, así que implica reemplazarlo. Por EX1, su evaluación suma el costo de migrar el sistema de cobro (Económico) y cómo se hace esa migración (Técnico).

Inpulse (grupo Mapal)

ANTECEDENTES

- **Tipo social:** empresa privada francesa, adquirida en diciembre de 2025 por el grupo español Mapal.
- **Sede y filiales:** Francia; Mapal (MAPAL Software S.L.) tiene sede en Madrid y presencia en 54 países. Declara presencia en Latinoamérica, pero no encontramos oficina ni representante en Argentina.
- **Trayectoria:** fundada en 2018. Más de 3.500 locales en Europa, en redes de 5 a más de 300 establecimientos, como O'Tacos (360 locales) y Columbus Café (220). Panaderías como L'Atelier Papilles (citada en T-03).
- **Recursos y estrategia:** integración con la plataforma Mapal OS, que tiene más de 50.000 establecimientos (KFC, Burger King, Starbucks), y foco en IA.

PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO

- **Producto:** Inpulse, back-office con IA para redes de varios locales.
- **Funcionalidades clave:**
  - Tableros consolidados en tiempo real para compras, finanzas y operaciones.
  - **Benchmarking entre locales de la red** para detectar anomalías.
  - Control de costo de mercadería y margen.
  - Reducción de merma.
  - Fichas técnicas estandarizadas.
  - App mobile para los equipos.
- **Requerimientos técnicos:** SaaS, con datos alojados en Europa.
- **Integración:** más de 60 POS y agregadores vía API. No encontramos información pública que confirme la integración con AyresPOS ni con PedidosYa.
- **Licenciamiento:** no publicado.

ALINEACIÓN CON LOS CRITERIOS DEL CLIENTE

- **Funcional:** es la referencia más cercana a la visión de T-03, y su caso de panaderías respalda la hipótesis de 3 a 5 puntos de rentabilidad.
- **Proveedor y Técnico:** son sus puntos débiles: no tiene representación local verificada, los datos se alojan fuera del país y la integración con el POS argentino es incierta.

PRESELECCIÓN

Tipo de solución que mejor se adapta al cliente:

- Una **plataforma de gestión gastronómica en la nube para cadenas y franquicias**: back-office para varios locales con tablero central para la casa matriz.
- De un **proveedor con presencia y soporte en Argentina**.
- Que amplíe el POS actual (AyresPOS) o, si lo reemplaza, que permita una migración ordenada y paulatina (EX1).

Esto descarta las herramientas de BI genéricas (requieren desarrollo) y es coherente con el escenario 4 de T-04 (SaaS + modular).

Proveedor seleccionado	Motivo principal de la elección
Ayres IT (ampliación de AyresPOS)	Es el proveedor actual del POS: no hay migración, la integración ya existe y es el proveedor local con más experiencia en cadenas y franquicias. Encaja con los dos aspectos de Proveedor y Técnico (50% entre ambos)
Maxirest	El proveedor local de mayor trayectoria (desde 1991) y con módulo de centralización de sucursales. Es fuerte en Proveedor y Funcional
Bistrosoft	Es 100% cloud, con línea para franquicias y permisos por franquiciado. Es la alternativa mejor alineada en lo técnico entre las que reemplazan el POS

Los tres pasan a la RFP. Maxirest y Bistrosoft reemplazan a AyresPOS: por EX1, su evaluación suma el costo de migrar el sistema de cobro (Económico) y cómo se hace esa migración (Técnico).

Proveedores no seleccionados:

- **Inpulse:** funcionalmente es el más cercano a la visión, pero falla en Proveedor (15%): no tiene representación ni soporte verificado en Argentina, los datos se alojan en Europa y la integración con AyresPOS no está confirmada. Para una casa matriz sin equipo de IT, ese riesgo no es aceptable.
- **Power BI y Tableau:** no superan el prefiltro de producto existente (prefiltro 2, EX5). Solo resuelven la visualización.
- **Restaurant365:** no supera el prefiltro económico (unos USD 21.000–31.000 por mes para 45 locales) y no tiene localización argentina verificada.
- **Fudo:** está orientado al restaurante independiente y no muestra una solución para cadenas o franquicias con consolidación de varios locales, que es el núcleo de US-02.
